



N°12 septembre 2011

CSP Besançon Centre




Les noms opérationnels des CSP sont officiellement arrêtés : CSP Besançon Centre et CSP Besançon Est

Les travaux de gros œuvre sont réalisés à 90%.

La charpente et la couverture sont posées en totalité sur les zones 1 et 3 et partiellement sur la zone 4.

Après calage du planning la **livraison du bâtiment est prévue le 20 mai 2012.**

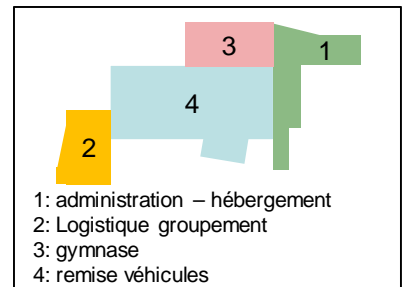


CSP Besançon Est



La pose de la charpente sur la zone 2 a démarré le lundi 12 septembre 2011.

En zone 1, l'intégralité du cloisonnement est réalisée dans les parties hébergement et administration.

Après calage du planning la **livraison du bâtiment est prévue le 15 février 2012.**

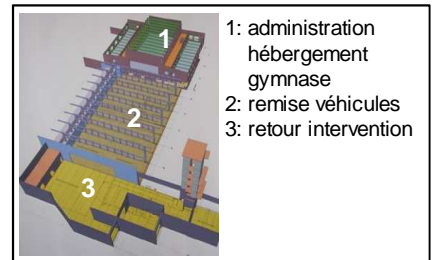

Capitaine Sébastien FREIDIG
